

RETOMADA DO PROJETO · IAPI

Estágio atual, evolução realizada e próximos marcos

Plataforma SaaS de gestão de propriedade intelectual, com foco em marcas e rotinas do INPI.

CLIENTE

Aminy Gusmão · Nome Que Marca

DESENVOLVIDO POR

Renato Paes · Dardo Science

OBJETIVO

Apresentar a retomada e alinhar continuidade

01 — CONTEXTO DA REUNIÃO

Por que estamos conversando agora

Esta reunião tem como objetivo apresentar a **retomada do projeto IAPI** de forma estruturada. Antes de propor qualquer evolução, realizamos um **levantamento técnico do legado já existente** — analisando o que foi efetivamente construído no backend e no frontend, como o sistema está organizado e qual lógica de negócio já está implementada.

A proposta do encontro é alinhar três pontos com clareza: **o estágio atual** do projeto, **a evolução já realizada** e os **próximos marcos** de continuidade. Trabalhamos a partir de fatos verificados no código, e não de suposições.

02 — VISÃO GERAL DO PROJETO

O que é o IAPI

O IAPI é uma **plataforma SaaS de gestão de propriedade intelectual**. Seu foco principal está em **marcas, processos e rotinas ligadas ao INPI** — o ciclo que vai do cadastro do ativo ao acompanhamento das movimentações processuais e dos prazos legais.

A concepção do sistema é a de um produto de software multiusuário, pensado para operar a rotina de um escritório de PI: clientes, ativos de marca, processos, tarefas, prazos, agenda, finanças e indicadores reunidos em um mesmo ambiente, com automações apoiando a operação.

EM RESUMO

Não estamos diante de um projeto em branco. Existe um produto com modelagem de domínio, backend, frontend e lógica de negócio de PI já implementados — que agora passa por uma **retomada organizada** para evoluir com segurança.

03 — O QUE JÁ FOI DESENVOLVIDO

Uma base de produto já construída

O levantamento mostrou que o projeto possui frentes relevantes já implementadas, tanto no backend quanto no frontend. A seguir, o que foi efetivamente encontrado.

Backend — a fundação do sistema

Construído em **Python com FastAPI**, com persistência via SQLAlchemy, migrações com Alembic, configuração por Pydantic Settings e autenticação por **JWT (access e refresh token)** com criptografia de senhas. Há ainda processamento em segundo plano (APScheduler) iniciado junto com a aplicação e CORS configurado para o frontend.

FastAPI

SQLAlchemy

Alembic

Pydantic Settings

JWT + Passlib

APScheduler

A API já está **modular e organizada por função**, com rotas para os principais domínios da operação:

/auth

/users

/clients

/cases

/tasks

/finance

/analytics

/deadlines

/agenda

/automations

MODELAGEM DE DOMÍNIO JÁ EXISTENTE

Foram localizados modelos de negócio que sustentam um produto maduro — não apenas cadastros simples:

Estrutura & acesso

- Workspace, UserAccount, WorkspaceMembership, Role
- AuditLog (trilha de auditoria)

Financeiro

- Contas a receber e a pagar

Clientes & PI

- Client, ClientContact
- IpAsset, IpAssetTag, IpProcess, IpProcessMovement
- Valuation, ValuationScenario

Automação & eventos

- DomainEvent, AutomationRule, AutomationAction
- AutomationRun, JobRun

Lógica de negócio do INPI já implementada. Mais do que estrutura, o sistema já trata o fluxo processual: há uma máquina de estados simplificada para códigos de movimentação, em que determinados códigos alteram o status do processo, e uma lógica que **cria automaticamente prazos legais** a partir de eventos. Esse fluxo já cobre situações como:

Protocolo / depósito

Publicação

Concessão

Exigências

Prazo de oposição

Prazo de resposta

Renovação futura

Há ainda um **worker em segundo plano** que processa eventos pendentes, busca regras de automação ativas e cria execuções quando encontra correspondência. Isso evidencia que o projeto foi desenhado com uma **visão operacional avançada**, e não como um simples CRUD.

Frontend — a interface da operação

Construído em **React 19 com TypeScript e Vite**, estilizado com Tailwind, com navegação por React Router, gráficos com Recharts e calendário com React Big Calendar. A autenticação é gerida por contexto, com tokens em armazenamento local e integração com a API.

React 19

TypeScript

Vite

Tailwind

Recharts

React Router

A aplicação já conta com layout de sidebar, navegação protegida, controle de acesso por perfil, dashboard com indicadores e analytics com gráficos e filtros. As páginas já existentes incluem:

Dashboard

Agenda

Clientes

Casos

Prazos

Tarefas

Financeiro a receber

Financeiro a pagar

Leads

Propostas

Usuários

Analytics

Login

O frontend também já carrega uma **visão de permissões por tipo de usuário**, com sete perfis previstos:

admin_global

admin_tenant

advogado

paralegal

financeiro

cliente_dono

cliente_assistente

04 — O QUE FOI VALIDADO NA RETOMADA

A retomada não parte do zero

Além de confirmar a arquitetura e os módulos, o levantamento validou que o projeto **já teve uso e preparo de ambiente** — o que reduz o risco da continuidade e indica uma base aproveitável.

Configuração de ambiente

Arquivo `.env.example` com variáveis de banco, JWT, expiração de tokens e armazenamento. Aponta PostgreSQL, com suporte também a SQLite.

Banco local em uso

Localizado o arquivo `iapi.db`, o que sugere que o projeto já foi executado ou testado em ambiente local.

Migrações de banco

Migrações Alembic encontradas: estrutura inicial, adição de plano e tabelas financeiras, e ajuste de nomenclatura de campo de ativo.

Dados de demonstração (seed)

Seed que cria workspace, usuários, cliente, ativo, processo, prazos, tarefas e contas a pagar/receber — base mínima para demonstrar e desenvolver.

05 — SITUAÇÃO ATUAL DO PROJETO

Onde estamos, com transparência

Para ler o estágio atual com clareza, separamos o projeto em três camadas. Elas mostram, ao mesmo tempo, o valor já acumulado e o que ainda exige trabalho.

■ **Construído** — implementado no legado ■ **Validado** — confirmado na retomada

■ **A ajustar** — consolidar ou concluir

FRENTE	CONSTRUÍDO	VALIDADO	A AJUSTAR
Arquitetura de backend & autenticação	●	●	●
Modelagem de domínio & multi-tenant	●	●	●
Lógica de INPI, prazos & automação	●	●	●
Perfis & controle de acesso	●	●	●
Frontend: navegação, dashboard & analytics	●	●	●
Financeiro, agenda, tarefas & prazos	●	●	●
Módulo comercial (leads & propostas)	●	●	●
Módulo de documentos	●	●	●
Ambiente & dependências do backend	●	●	●

Em síntese: a **fundação está estruturada e validada**, parte das frentes está pronta e em funcionamento, e um conjunto pontual de itens precisa de continuidade — principalmente o alinhamento entre módulos e o saneamento técnico do legado.

06 — PONTOS DE ATENÇÃO TÉCNICOS

O que merece tratamento na continuidade

Como em qualquer retomada de projeto existente, o levantamento identificou pontos que pedem saneamento antes de avançar. Nenhum deles compromete o valor já construído — mas precisam ser tratados para garantir uma evolução segura e previsível.

Módulo comercial desalinhado

Parte do módulo comercial existe no frontend, mas está desalinhada com o backend atual — exige reconciliação entre as duas pontas.

Módulo de documentos como placeholder

A rota/componente de documentos ainda aparece como placeholder, ou seja, prevista mas não concluída.

Encoding e integridade de arquivos

Foram encontrados problemas de encoding em alguns textos do legado e arquivos com possível corrupção (erro de CRC), que pedem verificação de integridade.

Dependências do backend não consolidadas

Não foi localizado um manifesto claro de dependências Python (requirements.txt ou pyproject.toml), o que exige consolidar o ambiente para reprodutibilidade.

Em conjunto, esses pontos indicam que a retomada exige **saneamento técnico e reorganização** — um passo natural e planejado para dar segurança à continuidade.

07 — PRÓXIMOS PASSOS

O caminho de continuidade, em ordem

1 Saneamento técnico do legado

Resolver encoding, verificar integridade de arquivos e organizar o repositório.

2 Consolidação do ambiente

Reconstruir o manifesto de dependências e padronizar a execução do backend e do frontend.

3 Validação da integridade dos módulos

Confirmar o funcionamento ponta a ponta de cada módulo já existente.

4 Alinhamento entre frontend e backend

Reconciliar o módulo comercial e concluir o módulo de documentos.

5 Priorização funcional pelo negócio


Definir, junto à Nome Que Marca, quais frentes geram mais valor primeiro.

6 Retomada incremental das entregas

Evoluir o produto em ciclos curtos e previsíveis, com entregas verificáveis.

Um horizonte de fases, em estimativa

Os prazos abaixo são **estimativas iniciais**, organizadas em fases. Servem para dar visão de horizonte, e serão refinados após o aprofundamento técnico das primeiras etapas.

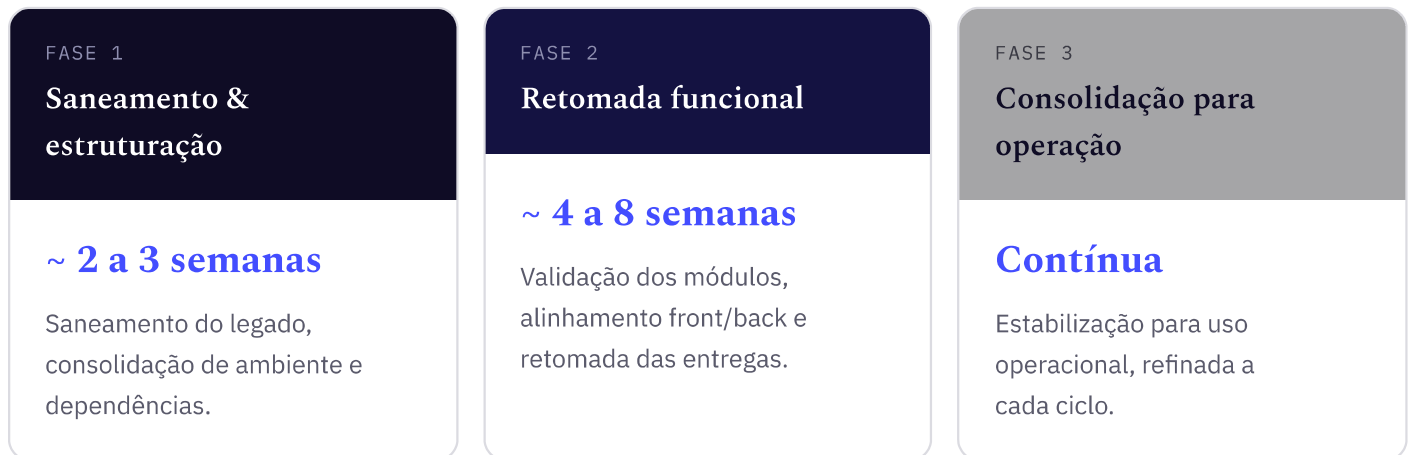

NOTA Estimativas sujeitas a validação após aprofundamento técnico. Os números poderão ser refinados nas próximas etapas, conforme a priorização funcional definida com a Nome Que Marca.

Já existe uma base importante de produto. O objetivo agora é transformá-la em continuidade segura e previsível.

O levantamento confirmou que o IAPI tem valor real acumulado: arquitetura definida, modelagem de domínio, lógica de negócio do INPI, autenticação e perfis, além de estrutura de frontend com dashboard, agenda, finanças, tarefas, prazos e analytics.

A retomada está sendo conduzida com visão estruturada e transparente: reconhecemos o que já existe, o que foi validado e o que precisa de ajuste. O próximo passo é alinhar prioridades com a Nome Que Marca e evoluir o produto de forma incremental, organizada e confiável.
